


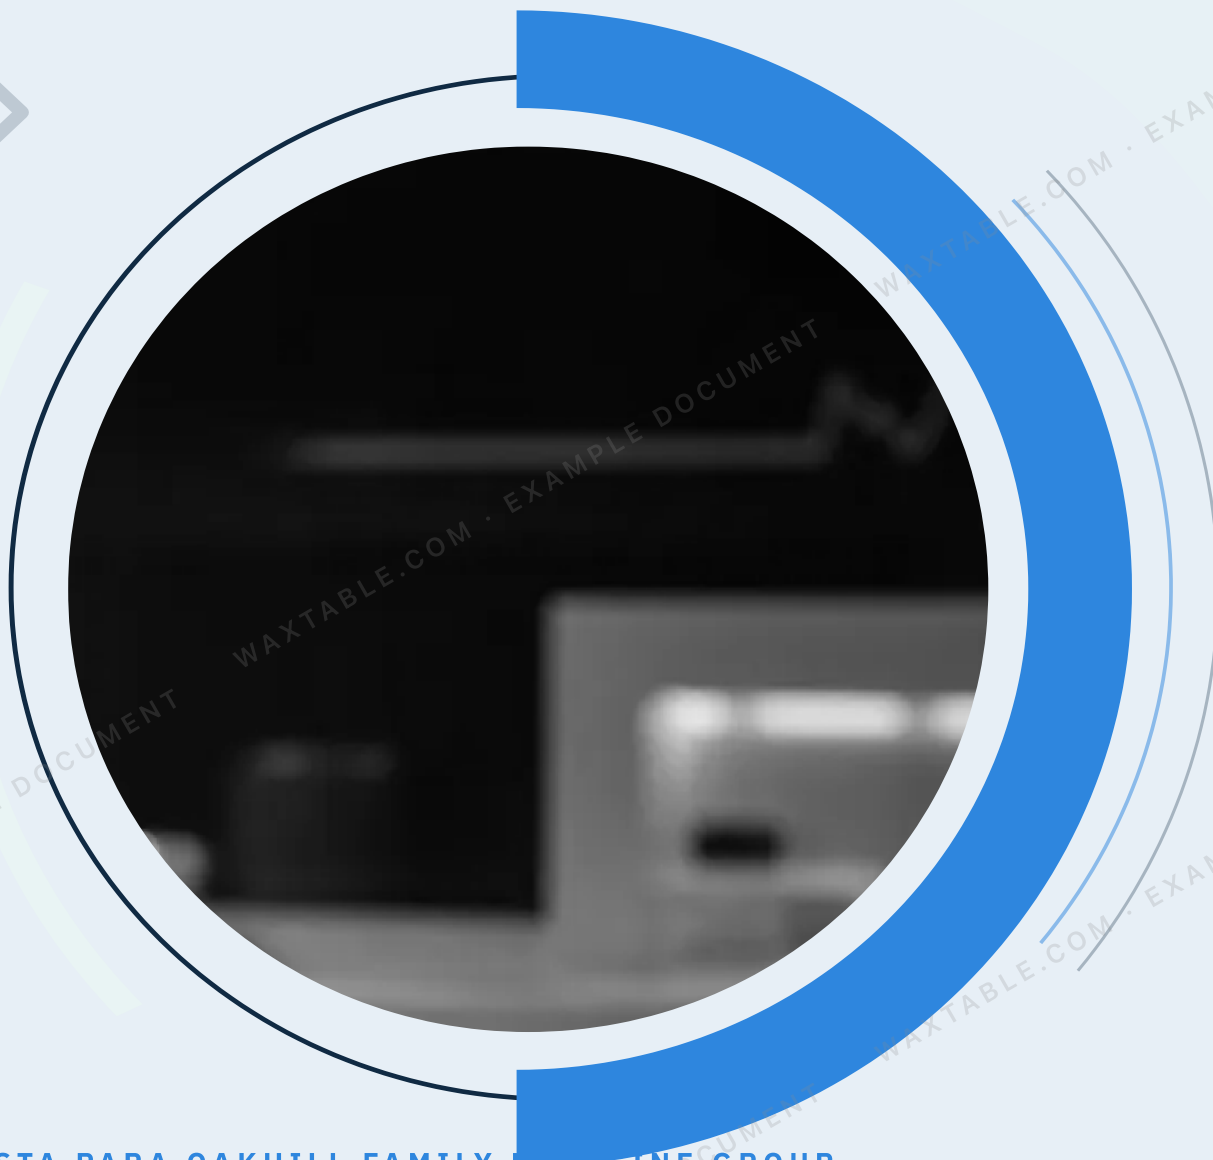

PROPOSTA PARA OAKHILL FAMILY MEDICINE GROUP

Proposta de Implantação de Diagnósticos

Infraestrutura terceirizada de exames diagnósticos — rede de transportadoras,
integração de LIS e um portal de resultados — em operação em doze clínicas em
um trimestre.

2026

[+ CHART INDEX](#)

Sumário

+ 01	Resumo geral	2
+ 02	O projeto em números	3
+ 03	A oportunidade	4
+ 04	Resumo executivo	4
+ 05	A experiência atual	4
+ 06	Desafio e abordagem	5
+ 07	Pontos de prova	6
+ 08	Situação e coberturas	6
+ 09	Em suas palavras	7
+ 10	Escopo do trabalho	8
+ 11	O que está incluído	9
+ 12	Entregas	10
+ 13	Trabalhos selecionados	10
+ 14	Cronograma	11
+ 15	Investimento e condições	12
+ 16	Detalhamento de honorários	12
+ 17	Resumo de custos	13
+ 18	Opções de contratação	14
+ 19	Comparativo de opções	14
+ 20	Cronograma de pagamento	15
+ 21	Premissas das quais esta estimativa depende	16
+ 22	Aceite	17

[RESUMO GERAL](#)

PROPOSTA

**PRO-2026-0201**

PARA APROVAÇÃO



PREPARADO PARA

**Oakhill Family
Medicine
Group — Dra.
Priya Anand,
Diretora
Médica**



PREPARADO POR

**Meridian
Diagnostics
Lab, Boston**



EMITIDO

**18 de
fevereiro de
2026**



VÁLIDO ATÉ

**1º de abril de
2026**



CONTRATAÇÃO

**Serviços de
Laboratório
Clínico**

+ RESUMO GERAL

O projeto em cinco números

CONTRATAÇÃO

+ 01

Serviços de Laboratório Clínico

Infraestrutura terceirizada de exames diagnósticos — rede de transportadoras, integração de LIS e um portal de resultados — em operação em doze clínicas em um trimestre.

INVESTIMENTO

+ 02

\$160,000

\$160,000 mais imposto sobre vendas de massachusetts (serviços de diagnóstico clínico isentos)

INÍCIO

+ 03

2 de março de 2026

Sujeito a aceitação até 1 de abril de 2026

DURAÇÃO

+ 04

12 meses

Do início à entrega final

PREPARADO PARA

+ 05

Oakhill Family Medicine Group

Dr. Priya Anand, Diretor médico

+ 01

A oportunidade

As doze clínicas da Oakhill Family Medicine Group encaminham painéis diagnósticos complexos ao laboratório regional mais próximo, o que resulta em doze prazos de entrega diferentes, doze formulários de requisição diferentes e nenhuma visão unificada dos resultados de um paciente em toda a rede. Este é o plano para consolidar os doze locais em um único laboratório de referência credenciado, com uma rede de transporte compartilhada e um portal de resultados voltado para médicos.

+ CLINICAL NOTE

Resumo executivo

A Oakhill Family Medicine Group cresceu de três clínicas para doze por meio de aquisições, mas seu fluxo de trabalho de exames diagnósticos nunca acompanhou esse crescimento. Os médicos solicitam painéis de rotina e complexos por meio do laboratório que cada unidade utilizou historicamente, os resultados chegam por fax ou login no portal dependendo do fornecedor, e não há uma visão consolidada do histórico de exames de um paciente entre as unidades. A equipe clínica gasta um tempo mensurável toda semana correndo atrás de resultados em vez de atender pacientes.

A Meridian Diagnostics Lab propõe uma implantação em fases que coloca as doze clínicas em um único laboratório de referência credenciado, uma única rede de transporte e um único portal de resultados voltado ao médico. Cuidamos da interface LIS/EHR, treinamos a equipe de flebotomia em cada unidade e validamos nosso menu de exames de acordo com os padrões CLIA e CAP antes que uma única amostra passe pela nova rede. As seções abaixo apresentam a abordagem, o escopo, o cronograma e o investimento.

+ FIGURE PLATE



+ COL A

O desafio

As doze clínicas atualmente usam pelo menos quatro laboratórios de referência diferentes, cada um com seu próprio horário de coleta da transportadora, papelada de requisição e método de entrega de resultados. Os médicos não conseguem ver o histórico completo de exames de um paciente em um só lugar, e os prazos de entrega inconsistentes dificultam saber quando um resultado está realmente atrasado.

Comercialmente, qualquer novo parceiro laboratorial precisa comprovar credenciamento e confiabilidade de integração antes que a Oakhill transfira volume dos fornecedores estabelecidos — e a transição precisa acontecer sem que uma única clínica perca a cobertura de exames durante a migração.

+ COL B

Nossa abordagem

Fazemos a implantação em três ondas de quatro clínicas, em vez de todas as doze de uma vez, para que cada onda valide as rotas de transporte, a integração e o treinamento da equipe antes que a próxima onda avance. Cada unidade mantém seu laboratório atual como contingência até que sua própria onda seja confirmada em operação.

A integração LIS/EHR, a rede de transporte e a validação CLIA/CAP acontecem antes da primeira onda, de modo que a entrada em operação seja uma mudança de equipe e de fluxo de trabalho para cada clínica — não um sistema novo que alguém precise aprender do zero.



SITUAÇÃO

Registros, coberturas e garantias

Certificados e apólices são fornecidos mediante solicitação e reemitidos para Oakhill Family Medicine Group mediante solicitação a qualquer momento durante o contrato.



A Meridian reduziu pela metade nosso tempo médio de retorno de resultados e deu a cada clínica a mesma interface. A integração foi a transição de laboratório mais tranquila que já fizemos.



DR. MARCUS FELD

+ 02

Escopo do trabalho

Uma implantação em fases de serviços terceirizados de testes diagnósticos nas doze clínicas de atenção primária da Oakhill Family Medicine Group, desde a logística de coleta até um portal de resultados para médicos, em operação em um trimestre.





SVC - 01

Avaliação do local e plano de integração



Uma auditoria de fluxo de trabalho em cada clínica, sequenciada em três ondas de integração.



SVC - 02

Engenharia de integração LIS/EHR



Desenvolvimento e testes de interface HL7 com o sandbox do EHR da Oakhill antes de qualquer movimentação de amostras.



SVC - 03

Design da rede de transporte



Rotas de coleta em cadeia fria duas vezes ao dia cobrindo as doze clínicas, com atendimento STAT aos sábados.



SVC - 04

Validação CLIA e CAP



Validação do menu de exames e documentação de acreditação concluídas antes do lançamento.



SVC - 05

Treinamento e certificação de flebotomia



Treinamento presencial da equipe e aprovação do protocolo atualizado de manuseio de amostras em cada clínica.



SVC - 06

Implantação do portal de resultados



Portal voltado a médicos com login único integrado ao EHR e alertas automáticos de valores críticos.

+ SCOPE OF CARE

Entregas

**LOGÍSTICA****+ DLV- 01****Rede de coleta, em operação**

Rotas de coleta em cadeia fria duas vezes ao dia, cobrindo todas as doze clínicas, incluindo atendimento STAT aos sábados.

**INTEGRAÇÃO****+ DLV- 02****Interface LIS/EHR**

Uma interface HL7 testada, entregando resultados diretamente no prontuário eletrônico (EHR) da Oakhill em até uma hora.

**CONFORMIDADE****+ DLV- 03****Dossiê de acreditação CLIA/CAP**

Documentação validada do menu de exames e registros de acreditação para cada painel dentro do escopo.

**TREINAMENTO****+ DLV- 04****Registros de certificação de flebotomia**

Documentação de aprovação para a equipe treinada e certificada nas doze clínicas.

**TECNOLOGIA****+ DLV- 05****Portal de resultados para médicos**

Um portal seguro, habilitado para SSO, com alertas automáticos de valores críticos.

FORA DO ESCOPO

- Equipamentos de teste no local (point-of-care) já pertencentes às clínicas da Oakhill
 - Anatomia patológica e revisão de amostras de tecido
 - Painéis de sequenciamento genético e molecular fora do menu padrão
 - Equipe de flebotomia no local (as clínicas fornecem sua própria equipe de coleta)
-





+ PHASE- 01

SEMANAS 1-2 · AVALIAÇÃO DAS UNIDADES

Auditoria de fluxo de trabalho em todas as doze clínicas e sequenciamento das ondas de implantação.



+ PHASE- 02

SEMANAS 3-5 · ENGENHARIA DE INTEGRAÇÃO

Construção e teste da interface HL7 no ambiente de testes do EHR da Oakhill.



+ PHASE- 03

SEMANAS 6-8 · CONFIGURAÇÃO DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA

Rotas de transporte com cadeia de frio, horários de coleta e cobertura STAT estabelecidos.



+ PHASE- 04

SEMANAS 9-10 · TREINAMENTO E CERTIFICAÇÃO DA EQUIPE

Treinamento e homologação do protocolo de flebotomia em cada clínica.

+ 03

Investimento e condições

Pressupõe que o fornecedor de prontuário eletrônico (EHR) da Oakhill disponibilize acesso a ambiente de testes (sandbox) e um contato de implementação no início do projeto, que os contratos atuais com o fornecedor de laboratório possam ser encerrados ou executados em paralelo até a transição, e que cada clínica consiga liberar a equipe clínica para uma sessão de treinamento de meio período. Alterações a essas premissas afetam o cronograma e o custo, o que confirmariamos por escrito antes de prosseguir. Esta proposta é válida para contratações iniciadas até 1º de abril de 2026.

+ STATEMENT

FRENTE DE TRABALHO	SEMANAS	TAXA	VALOR
Avaliação das unidades e implantação Auditoria de fluxo de trabalho clínico em 12 unidades	12	\$750 / clinic	\$9,000
Engenharia de integração LIS/EHR Construção e teste de interface bidirecional HL7	1	\$38,000	\$38,000
Implantação da rede de transporte Rotas de transporte com cadeia de frio duas vezes ao dia, 12 clínicas	1	\$26,000	\$26,000
Painel de validação CLIA/CAP Validação do menu de exames de referência e registro de credenciamento	1	\$17,000	\$17,000
Treinamento e certificação de flebotomia Treinamento presencial da equipe, todas as clínicas	12	\$1,250 / clinic	\$15,000
Portal de resultados para médicos Implantação do portal, alerta de valores críticos, SSO com o prontuário eletrônico	1	\$24,000	\$24,000
Total da contratação			\$160,000

+ SUMMARY

Taxa do projeto	\$160,000
Imposto sobre vendas de Massachusetts (serviços de diagnóstico clínico isentos)	\$0
Total	\$160,000
+ TOTAL DEVIDO \$160,000	

Todos os valores estão em USD. Cobrado em três marcos: 40% na assinatura, 30% no início da produção, 30% na entrega. O valor é válido para contratações iniciadas até 1º de abril de 2026.

+ PLAN 01

LANÇAMENTO DE REDE

\$160,000

+ Integração completa em 12 clínicas

+ Rede de transporte e logística de cadeia fria

+ Desenvolvimento de interface LIS/EHR

+ 90 dias de suporte de QA para o lançamento

+ PLAN 02

LANÇAMENTO DE REDE + CUIDADO

\$7,500/mo

+ Tudo do Lançamento de Rede

+ Logística contínua de transporte e amostras

+ Relatório mensal de QA de tempo de retorno

+ Contato dedicado de sucesso do cliente

+ PLAN 03

PARCEIRO DE DIAGNÓSTICO COMPLETO

\$14,000/mo

+ Tudo dos Cuidados

+ Menu de exames de referência ampliado

+ Revisão trimestral de acreditação

+ Escalonamento prioritário de valores críticos

+ COMPARE

OPÇÕES

Qual modelo combina com você

	LANÇAMENTO DE REDE	LANÇAMENTO DE REDE + CUIDADO	PARCEIRO DE DIAGNÓSTICO COMPLETO
Preço	\$160,000	\$7,500/mo	\$14,000/mo
Escopo principal	Integração completa em 12 clínicas	Tudo do Lançamento de Rede	Tudo dos Cuidados
O que está incluído	Rede de transporte e logística de cadeia fria	Logística contínua de transporte e amostras	Menu de exames de referência ampliado
Entrega	Desenvolvimento de interface LIS/EHR	Relatório mensal de QA de tempo de retorno	Revisão trimestral de acreditação
Suporte pós-entrega	90 dias de suporte de QA para o lançamento	Contato dedicado de sucesso do cliente	Escalonamento prioritário de valores críticos

Os preços estão em USD e não incluem o imposto sobre vendas de Massachusetts (serviços de diagnóstico clínico isentos). As opções podem ser combinadas ou escalonadas; a recomendação para Oakhill Family Medicine Group está destacada na seção de preços.

Quando cada parcela vence

N.º	MARCO	GATILHO	PARCELA	VALOR
01	Semanas 1–2 · Avaliação das unidades	2 de março de 2026	40%	\$64,000
02	Semanas 3–5 · Engenharia de integração	No início da entrega	30%	\$48,000
03	Semanas 6–8 · Configuração de transporte e logística	Na aceitação do marco	30%	\$48,000
Total (sem impostos)			100%	\$160,000

As parcelas são faturadas com base nos marcos acima e devem ser pagas em até 30 dias após cada fatura. Todos os valores estão em USD e excluem imposto sobre vendas de Massachusetts (serviços de diagnóstico clínico isentos).

+ ADVISORY

Premissas das quais esta estimativa depende



Pressupõe que o fornecedor de EHR da Oakhill disponibilize acesso ao ambiente de testes e um contato de implantação no início do projeto, que os contratos atuais com fornecedores de laboratório possam ser encerrados ou executados em paralelo durante a transição, e que cada clínica possa liberar a equipe clínica para uma sessão de treinamento de meio período. Alterações nessas condições afetam prazo e custo, o que confirmaremos por escrito antes de prosseguir. Esta proposta é válida para contratações iniciadas até 1º de abril de 2026.

A contra-assinatura abaixo aceita o escopo, o cronograma e o investimento definidos nesta proposta e autoriza o início do trabalho.

+

SIG- 01

**PELA OAKHILL FAMILY
MEDICINE GROUP**

Dra. Priya Anand
 DIRETORA MÉDICA
 Data

+

SIG- 02

PELA MERIDIAN DIAGNOSTICS LAB

Meridian Diagnostics Lab
 SIGNATÁRIO AUTORIZADO
 Data




PRÓXIMOS PASSOS

Prontos quando você estiver

A aceitação desta proposta dá início ao trabalho em 2 de março de 2026. O valor permanece válido para contratações confirmadas até 1 de abril de 2026.

Aprove esta proposta e poderemos agendar as visitas de avaliação do local para a semana de 2 de março. Responda a este documento ou envie um e-mail para results@meridiandiagnostics.com.



Meridian Diagnostics Lab

results@meridiandiagnostics.com • +1 617 555 0198 • meridiandiagnostics.com •
Boston, MA 02111
