ELEVATE IT SOLUTIONS

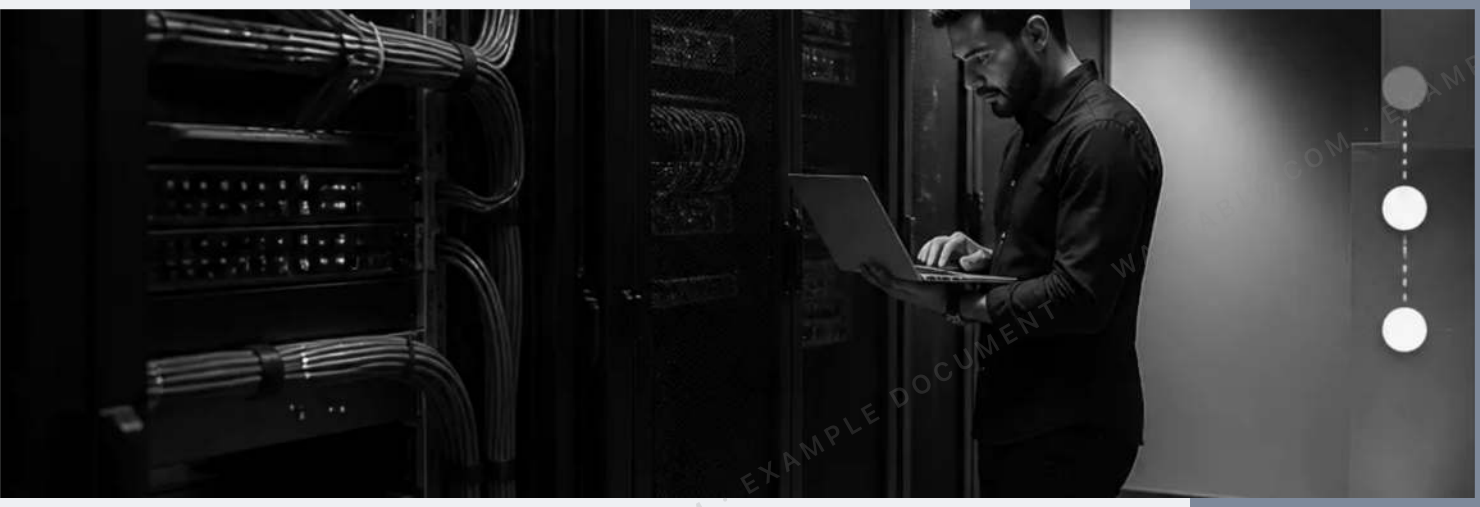

PROPUESTA PARA BRAMWELL LEGAL GROUP

Propuesta de Actualización de TI de Bramwell

Soporte de TI gestionado y actualización de infraestructura en las cinco oficinas de Bramwell Legal Group en Texas.

2026

WAXTABLE.COM · EXAMPLE DOCUMENT

Contenido

01 De un vistazo 2
02 El proyecto en cifras 3
03 La oportunidad 5
04 Resumen ejecutivo 5
05 La experiencia actual 5
06 Desafío y enfoque 6
07 Puntos de evidencia 7
08 Situación y coberturas 7
09 En sus palabras 8
10 Alcance del trabajo 9
11 Qué incluye 9
12 Entregables 9
13 Trabajo seleccionado 10
14 Cronograma 11
15 Inversión y condiciones 12
16 Desglose de honorarios 12
17 Resumen de costos 13
18 Opciones del proyecto 13
19 Comparación de opciones 13
20 Calendario de pagos 14
21 Supuestos de los que depende esta estimación 15
22 Aceptación 15

DE UN VISTAZO

PROPUESTA

PRO-2026-0447

PARA APROBACIÓN

WAXTABLE.COM · EXAMPLE DOCUMENT

PREPARADO PARA

Bramwell Legal Group — Marcus Whitfield, Director de Operaciones

PREPARADO POR

Elevate IT Solutions, Dallas

EMITIDO

27 de julio de 2026

VÁLIDO HASTA

21 de agosto de 2026

ENCARGO

Infraestructura y TI Gestionada

DE UN VISTAZO

El proyecto en cinco cifras

01 ENCARGO

Infraestructura y TI Gestionada

Soporte de TI gestionado y actualización de infraestructura en las cinco oficinas de Bramwell Legal Group en Texas.

02 INVERSIÓN

$160,860

$148,600 más impuesto sobre ventas y uso de texas — 8.25%

03 INICIO

24 de agosto de 2026

Sujeto a aceptación antes del 21 de agosto de 2026

04 DURACIÓN

12 meses

Del inicio a la entrega final

WAXTABLE.COM · EXAMPLE DOCUMENT

05

PREPARADO PARA

Bramwell Legal Group

Marcus Whitfield, Director de operaciones

WAXTABLE.COM · EXAMPLE DOCUMENT

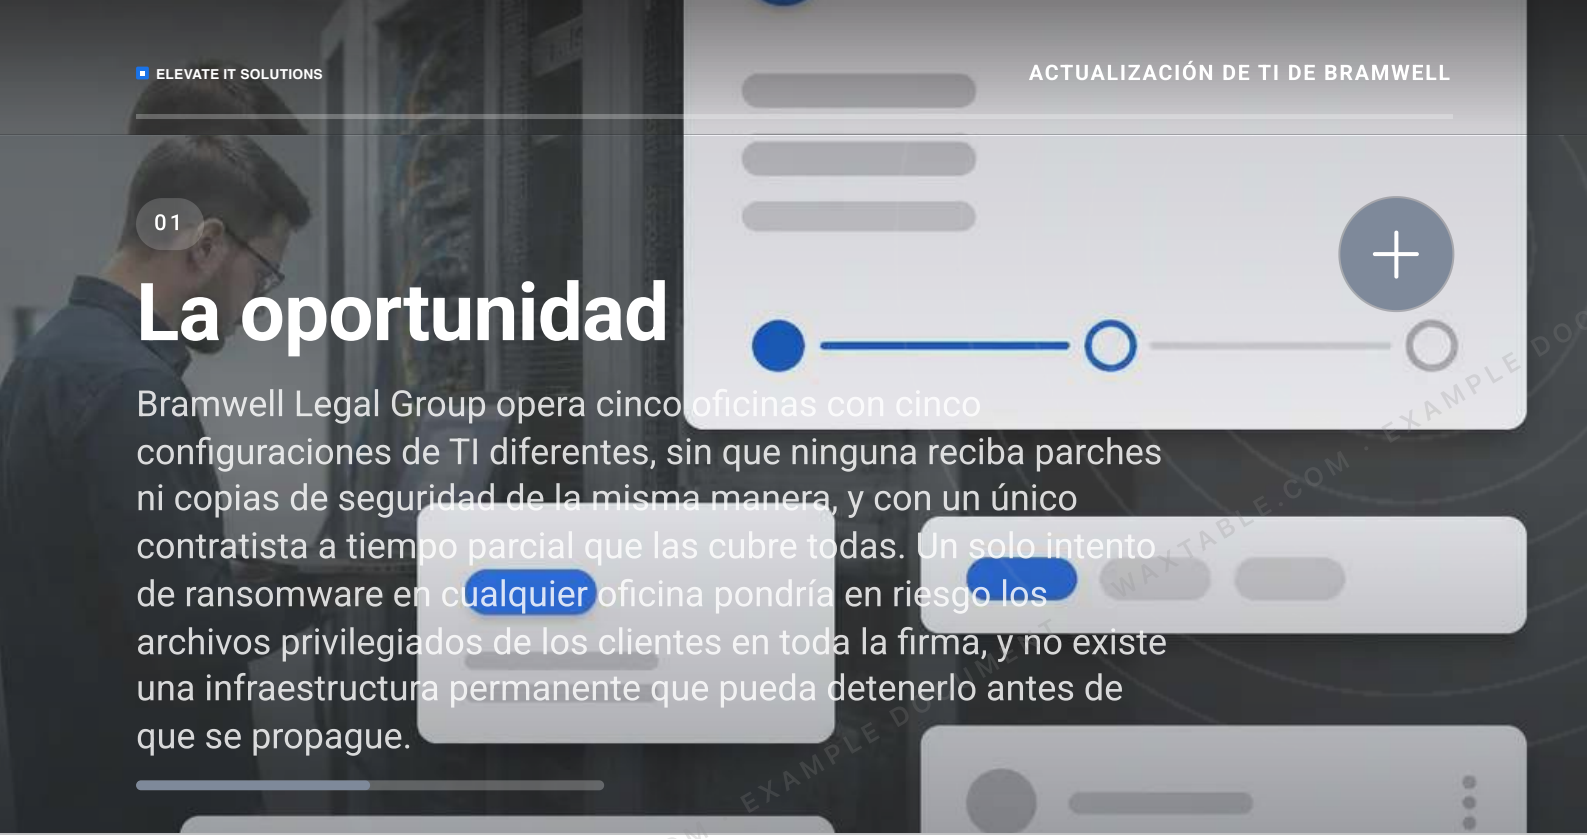

01

La oportunidad

Bramwell Legal Group opera cinco oficinas con cinco configuraciones de TI diferentes, sin que ninguna reciba parches ni copias de seguridad de la misma manera, y con un único contratista a tiempo parcial que las cubre todas. Un solo intento de ransomware en cualquier oficina pondría en riesgo los archivos privilegiados de los clientes en toda la firma, y no existe una infraestructura permanente que pueda detenerlo antes de que se propague.

Resumen ejecutivo

Bramwell Legal Group opera cinco oficinas en Texas, cada una con su propio conjunto heterogéneo de servidores, cortafuegos y rutinas de copia de seguridad, con el respaldo de un único contratista de TI a tiempo parcial. Esa inconsistencia deja los datos privilegiados de clientes expuestos a la oficina con seguridad más débil, y la firma carece de monitorización permanente o verificación de copias de seguridad en cualquiera de sus cinco sedes.

Elevate IT Solutions propone un compromiso de catorce semanas para estandarizar la seguridad de cortafuegos, copias de seguridad y endpoints en las cinco oficinas, migrar el almacenamiento de archivos a una infraestructura cifrada y monitorizada, y transferir el soporte continuo a una mesa de ayuda gestionada 24/7. Las siguientes secciones exponen el enfoque, los entregables, el calendario y la inversión.

WAXTABLE.COM · EXAMPLE DOCUMENT

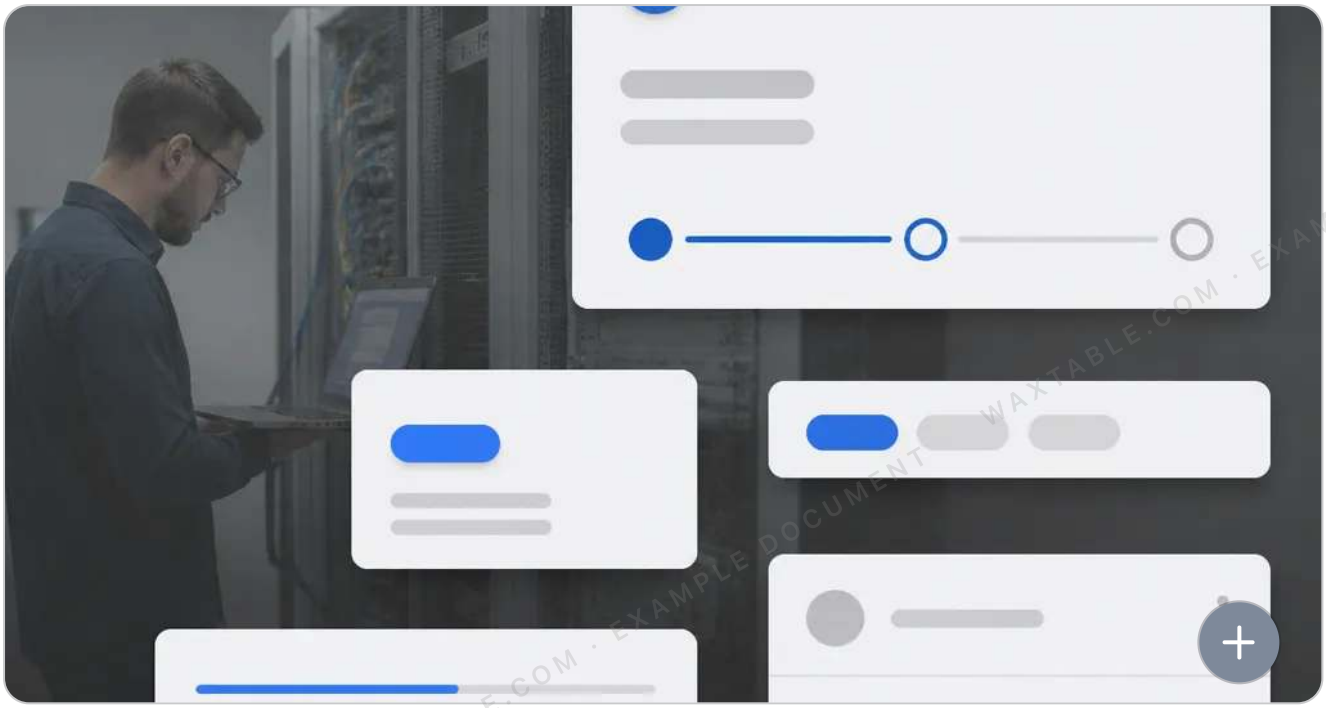

01

El reto

Cada una de las cinco oficinas de Bramwell utiliza hardware distinto, rutinas de copia de seguridad distintas y calendarios de parches distintos, de modo que una sola brecha de seguridad en cualquiera de ellas pone en riesgo los archivos privilegiados de clientes en toda la firma.

La migración debe realizarse sin interrumpir el trabajo activo de los casos: los abogados no pueden perder el acceso a los archivos de clientes en mitad de un litigio mientras se migran los servidores.

02

Nuestro enfoque

Estandarizamos una oficina a la vez, empezando por las dos más pequeñas, de modo que el proceso de migración quede probado y sea repetible antes de abordar la oficina más grande de la firma y su mayor carga de casos.

Cada migración se realiza fuera del horario laboral con un plan de reversión el mismo día, de modo que ningún abogado pierde el acceso a un archivo activo durante el horario laboral.

WAXTABLE.COM · EXAMPLE DOCUMENT

01
5
SEDES DE OFICINA ESTANDARIZADAS

02
24/7
COBERTURA DE MESA DE AYUDA GESTIONADA

03
14 sem
DE LA EVALUACIÓN AL CAMBIO COMPLETO

Registros, coberturas y garantías

CREDENCIAL	ENTIDAD EMISORA	REFERENCIA	ALCANCE	ESTADO
Entidad registrada	Registro de sociedades, Estados Unidos	Elevate IT Solutions LLC	Nombre comercial e identidad jurídica	Activo
Registro fiscal	Autoridad fiscal, Estados Unidos	EIN 75-3948210	Todos los trabajos facturados	Activo
Seguro de responsabilidad civil profesional	Aseguradora comercial	Disponible a solicitud	Infraestructura y TI Gestionada	Se renueva anualmente
Seguro de responsabilidad civil general	Aseguradora comercial	Disponible a solicitud	Trabajos en sitio y en las instalaciones del cliente	Se renueva anualmente
Afiliación a un organismo profesional	**Asociación sectorial, Estados Unidos**	**Disponible a solicitud**	**Código de conducta y procedimiento de reclamaciones**	**Al corriente**

Los certificados y anexos de pólizas se entregan a solicitud y se reemiten a Bramwell Legal Group a solicitud en cualquier momento durante el encargo.

> **Elevate transformó la TI inconsistente de cinco oficinas en un sistema en el que finalmente confiamos con los archivos de clientes, y nadie perdió ni una hora facturable por inactividad.**
>
> Marcus Whitfield

WAXTABLE.COM · EXAMPLE DOCUMENT

02

Alcance del trabajo

Un encargo de servicios gestionados e infraestructura que estandariza la seguridad de red, la infraestructura de servidores y el soporte de mesa de ayuda en las cinco oficinas de Bramwell Legal Group.

01 Evaluación de red y seguridad

Auditoría de hardware, configuración de cortafuegos y cobertura de copias de seguridad en las cinco oficinas.

02 Estandarización de cortafuegos y puntos finales

Dispositivos de cortafuegos uniformes y seguridad de puntos finales gestionada implementados en toda la firma.

03 Migración de almacenamiento de archivos

Migración a una infraestructura de almacenamiento de archivos centralizada, cifrada y supervisada.

04 Automatización y verificación de copias de seguridad

Copias de seguridad nocturnas automatizadas con pruebas semanales de restauración en todas las oficinas.

05 Implementación de VoIP

Líneas telefónicas heredadas sustituidas por un sistema VoIP unificado en todas las sedes.

06 Transición y formación de mesa de ayuda

Mesa de ayuda continua 24/7 puesta en marcha junto con formación de concienciación en seguridad para el personal.

Entregables

01 EVALUACIÓN

Evaluación de red en las cinco oficinas

Auditoría completa del hardware, la postura de seguridad y la cobertura de copias de seguridad en las cinco oficinas.

02 SEGURIDAD

Firewall y protección de endpoints estandarizados

Dispositivos de firewall uniformes y protección de endpoints implementados en las cinco oficinas.

03 INFRAESTRUCTURA

Almacenamiento de archivos cifrado y supervisado

Migración del almacenamiento de archivos de la firma a una infraestructura centralizada, cifrada y supervisada.

04 COPIAS DE SEGURIDAD

Copias de seguridad automatizadas y verificadas

Copias de seguridad automáticas diarias con verificación semanal de restauración en todas las oficinas.

05 COMUNICACIONES

Implementación de sistema telefónico VoIP

Sistema telefónico VoIP unificado que sustituye las líneas telefónicas antiguas en las cinco oficinas.

FUERA DEL ALCANCE

- Licencias de software de gestión de casos y práctica jurídica
- Nuevas obras de acondicionamiento de oficinas, cableado o construcción física
- Compras de hardware más allá de los firewalls, switches y estaciones de trabajo especificados
- Contratación de póliza de ciberseguro (responsabilidad del cliente)

WAXTABLE.COM · EXAMPLE DOCUMENT

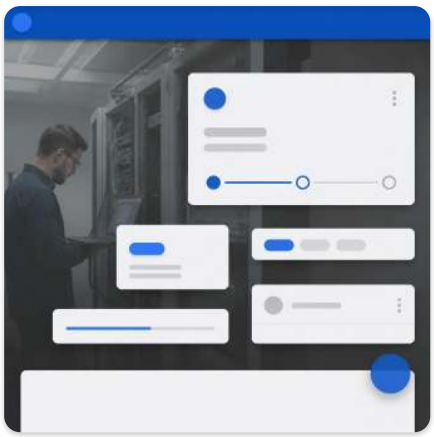

01

SEMANAS 1-2 · EVALUACIÓN DE LA RED

Auditoría completa del hardware, la postura de seguridad y la cobertura de copias de seguridad en las cinco oficinas.

02

SEMANAS 3-6 · IMPLEMENTACIÓN DE CORTAFUEGOS Y ENDPOINTS

Protección estandarizada de cortafuegos y endpoints implementada oficina por oficina.

03

SEMANAS 7-10 · MIGRACIÓN DE ALMACENAMIENTO DE ARCHIVOS Y COPIAS DE SEGURIDAD

Almacenamiento de archivos migrado a infraestructura cifrada con copias de seguridad automatizadas y verificadas.

04

SEMANAS 11-12 · IMPLEMENTACIÓN DE VOIP

Sistema telefónico VoIP unificado instalado y migrado en las cinco oficinas.

WAXTABLE.COM · EXAMPLE DOCUMENT

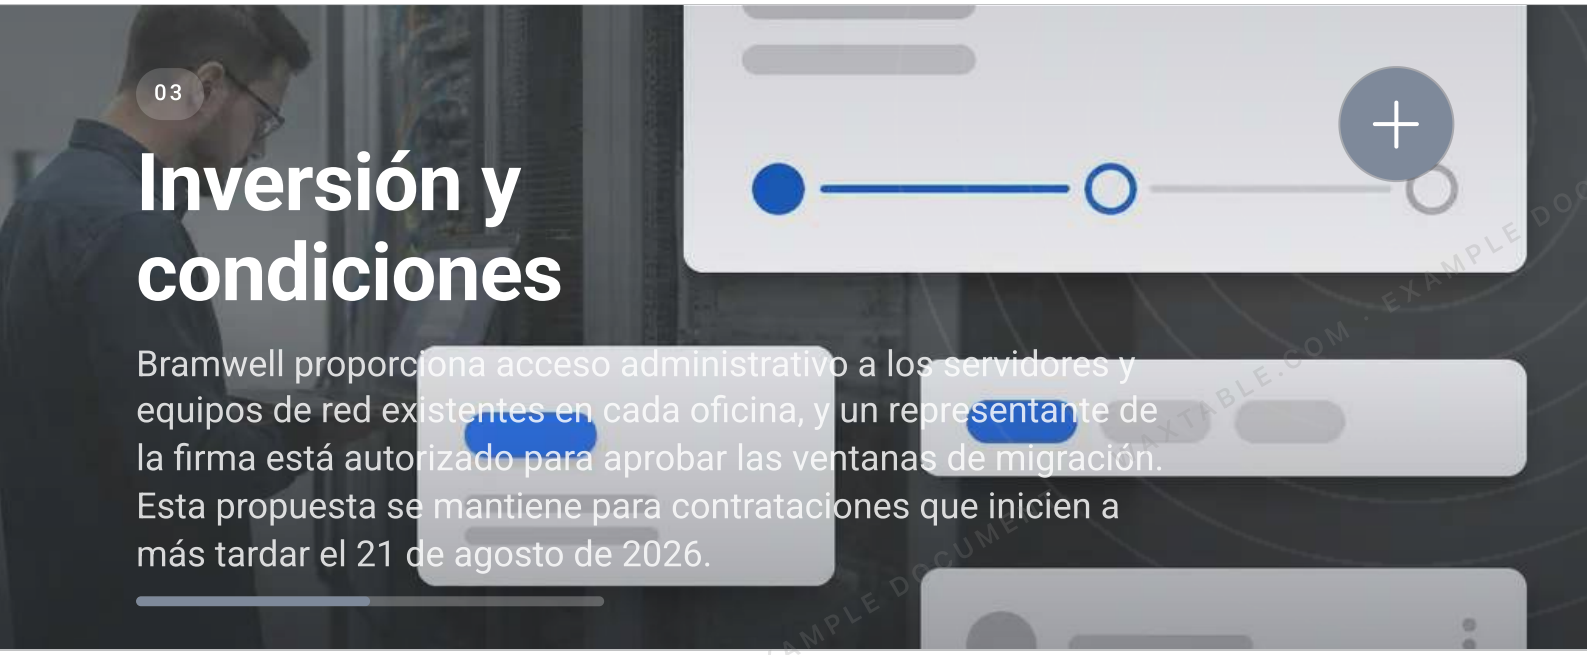

03

Inversión y condiciones

Bramwell proporciona acceso administrativo a los servidores y equipos de red existentes en cada oficina, y un representante de la firma está autorizado para aprobar las ventanas de migración. Esta propuesta se mantiene para contrataciones que inicien a más tardar el 21 de agosto de 2026.

FLUJO DE TRABAJO	SEMANAS	TARIFA	IMPORTE
Evaluación de red y seguridad de cinco oficinas Auditoría de hardware, cortafuegos y copias de seguridad en todas las sedes	1	$18,000	$18,000
Implementación de seguridad de cortafuegos y endpoints Dispositivos de cortafuegos estandarizados y protección de endpoints, 5 oficinas	5	$6,400 / office	$32,000
Migración a almacenamiento de archivos cifrado Infraestructura de almacenamiento centralizada, cifrada y monitorizada	1	$36,000	$36,000
Implementación de copias de seguridad automatizadas Copias de seguridad automáticas nocturnas con verificación de restauración semanal	5	$2,800 / office	$14,000
Implementación del sistema VoIP Sistema telefónico VoIP unificado, instalación y portabilidad de números	5	$4,200 / office	$21,000

WAXTABLE.COM · EXAMPLE DOCUMENT

Total del proyecto	$148,600

Honorarios del proyecto	$148,600
Impuesto sobre ventas y uso de Texas — 8.25%	$12,260
Total	$160,860

TOTAL ADEUDADO **$160,860**

Todos los montos están en USD. Facturado en tres hitos: 40% en la firma, 30% al inicio de la construcción, 30% en la entrega. La tarifa se mantiene para contrataciones que comiencen en o antes del 21 de agosto de 2026.

EVALUACIÓN Y ESTANDARIZACIÓN

$42,000

- Evaluación de red y seguridad de cinco oficinas
- Firewall y protección de endpoints estandarizados
- Plan de migración y documentación de reversión
- 30 días de soporte tras la implementación

ACTUALIZACIÓN COMPLETA DE INFRAESTRUCTURA

$148,600

- Todo lo incluido en Evaluación y Estandarización
- Migración de almacenamiento de archivos cifrado y supervisado
- Copias de seguridad diarias automatizadas y verificadas
- Despliegue de VoIP en las cinco oficinas

COLABORACIÓN GESTIONADA

$6,800/mo

- Todo lo incluido en Actualización Completa de Infraestructura
- Mesa de ayuda gestionada 24/7 con tiempos de respuesta garantizados
- Formación trimestral de concienciación en seguridad
- Gestión de parches y supervisión continua

Qué modalidad te conviene

	EVALUACIÓN Y ESTANDARIZACIÓN	ACTUALIZACIÓN COMPLETA DE INFRAESTRUCTURA	COLABORACIÓN GESTIONADA
Precio	$42,000	$148,600	$6,800/mo
Alcance principal	Evaluación de red y seguridad de cinco oficinas	Todo lo incluido en Evaluación y Estandarización	Todo lo incluido en Actualización Completa de Infraestructura
Qué incluye	Firewall y protección de endpoints estandarizados	Migración de almacenamiento de archivos cifrado y supervisado	Mesa de ayuda gestionada 24/7 con tiempos de respuesta garantizados
Entrega	Plan de migración y documentación de reversión	Copias de seguridad diarias automatizadas y verificadas	Formación trimestral de concienciación en seguridad
Servicio posterior	**30 días de soporte tras la implementación**	**Despliegue de VoIP en las cinco oficinas**	**Gestión de parches y supervisión continua**

Los precios están expresados en USD y no incluyen el impuesto sobre ventas y uso de Texas — 8.25%. Las opciones se pueden combinar o escalonar; la recomendación para Bramwell Legal Group se destaca en la sección de precios.

Cuándo vence cada cuota

N.º	HITO	DESENCADENANTE	PARTE	IMPORTE
01	Semanas 1-2 · Evaluación de la red	24 de agosto de 2026	40%	$59,440
02	Semanas 3-6 · Implementación de cortafuegos y endpoints	Al inicio de la entrega	30%	$44,580
03	Semanas 7-10 · Migración de almacenamiento de archivos y copias de seguridad	En la aceptación del hito	30%	$44,580
Total (sin impuestos)			**100%**	**$148,600**

Los plazos se facturan conforme a los hitos anteriores y son pagaderos dentro de los 30 días siguientes a cada factura. Todos los importes están en USD y excluyen impuesto sobre ventas y uso de texas — 8.25%.

Supuestos de los que depende esta estimación

Bramwell proporciona acceso administrativo a los servidores y al hardware de red existentes en cada oficina, y un representante de la firma está autorizado a aprobar las ventanas de migración. Esta propuesta es válida para compromisos que comiencen a más tardar el 21 de agosto de 2026.

Al firmar a continuación se acepta el alcance, el cronograma y la inversión establecidos en esta propuesta, y se autoriza el inicio del trabajo.

01 POR BRAMWELL LEGAL GROUP

Marcus Whitfield

Directora de Operaciones

Fecha

02 POR ELEVATE IT SOLUTIONS

Elevate IT Solutions

Firmante autorizado

Fecha

PRÓXIMOS PASOS

Listos cuando usted lo esté

La aceptación de esta propuesta da inicio al trabajo el 24 de agosto de 2026. La tarifa se mantiene para los proyectos confirmados antes del 21 de agosto de 2026.

Apruebe esta propuesta y programaremos la evaluación de red para la semana del 24 de agosto. Responda a este documento o escriba a support@elevateitsolutions.com.

WAXTABLE.COM · EXAMPLE DOCUMENT

Elevate IT Solutions
