



PROPOSITION POUR BRAMWELL LEGAL GROUP

Proposition de mise à niveau informatique pour Bramwell

Support informatique géré et mise à niveau de
l'infrastructure des cinq bureaux du Texas de Bramwell
Legal Group.

Sommaire

01	En bref	2
02	La mission en chiffres	3
03	L'opportunité	5
04	Résumé exécutif	5
05	L'expérience actuelle	5
06	Défi et approche	6
07	Preuves à l'appui	7
08	Statut et couvertures	7
09	Ils en parlent	8
10	Périmètre de la mission	9
11	Ce qui est inclus	9
12	Livrables	9
13	Réalisations sélectionnées	10
14	Calendrier	11
15	Investissement et conditions	12
16	Détail des honoraires	12
17	Récapitulatif des coûts	13
18	Options de mission	13
19	Comparatif des options	13
20	Échéancier de paiement	14
21	Hypothèses sur lesquelles repose cette estimation	15
22	Acceptation	15

● EN BREF

PROPOSITION

POUR APPROBATION

**PRO-2026-0447**

PRÉPARÉ POUR

**Bramwell Legal
Group —
Marcus
Whitfield,
Directeur des
Opérations**

PRÉPARÉ PAR

**Elevate IT
Solutions,
Dallas**

ÉMIS LE

27 juillet 2026

VALABLE JUSQU'AU

21 août 2026

MISSION

**Infrastructure
et services
informatiques
gérés**

EN BREF

La mission en cinq chiffres

01

MISSION

Infrastructure et services informatiques gérés

Support informatique géré et mise à niveau de l'infrastructure des cinq bureaux du Texas de Bramwell Legal Group.

02

INVESTISSEMENT

\$160,860

\$148,600 plus taxe de vente et d'utilisation du texas — 8.25%

03

DÉBUT

24 août 2026

Sous réserve d'acceptation avant le 21 août 2026

04

DURÉE

12 mois

Du lancement à la livraison finale

05

PRÉPARÉ POUR

Bramwell Legal Group

Marcus Whitfield, Directeur des opérations

01


L'opportunité

Bramwell Legal Group exploite cinq bureaux sur cinq configurations informatiques différentes, aucune corrigée ou sauvegardée de la même façon, avec un seul prestataire à temps partiel couvrant l'ensemble. Une seule tentative de rançongiciel dans n'importe quel bureau exposerait les dossiers clients confidentiels de tout le cabinet, sans infrastructure permanente pour l'intercepter avant qu'elle ne se propage.

+ Résumé exécutif

Bramwell Legal Group exploite cinq bureaux au Texas, chacun disposant de son propre assemblage disparate de serveurs, de pare-feu et de routines de sauvegarde, soutenu par un unique prestataire informatique à temps partiel. Cette incohérence expose les données confidentielles des clients à la faille du bureau le moins sécurisé, et le cabinet ne dispose d'aucune surveillance permanente ni de vérification des sauvegardes dans aucun de ses cinq sites.

Elevate IT Solutions propose un engagement de quatorze semaines visant à standardiser le pare-feu, la sauvegarde et la sécurité des terminaux dans les cinq bureaux, à migrer le stockage des fichiers vers une infrastructure surveillée et chiffrée, et à faire passer le support courant à une assistance gérée 24 h/24 et 7 j/7. Les sections suivantes présentent l'approche, les livrables, le calendrier et l'investissement.

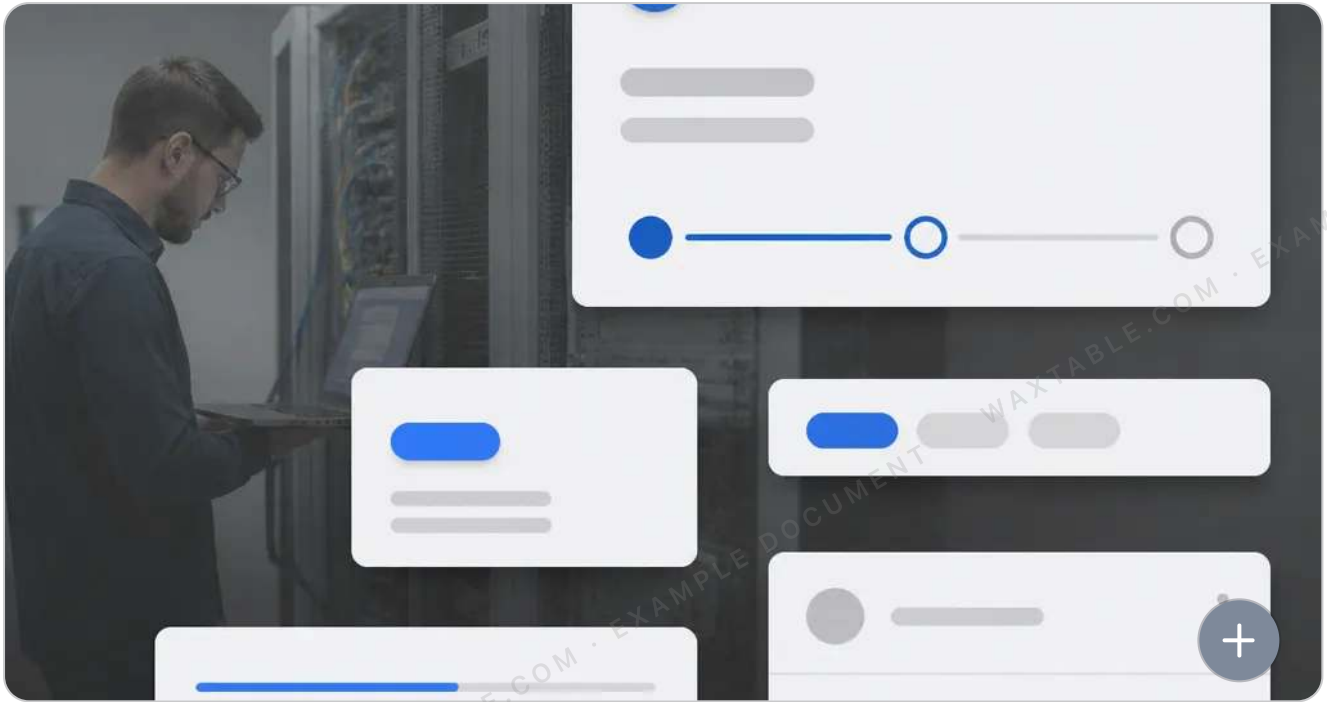

01

Le défi

Chacun des cinq bureaux de Bramwell fonctionne avec un matériel, des routines de sauvegarde et des calendriers de correctifs différents, de sorte qu'une seule faille de sécurité dans un bureau met en péril les fichiers confidentiels des clients à l'échelle du cabinet.

La migration doit s'effectuer sans interrompre les dossiers en cours — les avocats ne peuvent pas perdre l'accès aux fichiers clients en pleine procédure pendant le basculement des serveurs.

02

Notre approche

Nous standardisons un bureau à la fois, en commençant par les deux plus petits, afin que le processus de migration soit éprouvé et reproductible avant d'aborder le plus grand bureau du cabinet et sa charge de dossiers la plus lourde.

Chaque bascule s'effectue en dehors des heures de bureau avec un plan de retour en arrière le jour même, afin qu'aucun avocat ne perde l'accès à un dossier actif pendant les heures ouvrées.

01

5

EMPLACEMENTS DE
BUREAUX STANDARDISÉS

02

24 h/24,
7 j/7COUVERTURE
D'ASSISTANCE GÉRÉE

03

14 sem.

DE L'ÉVALUATION À LA
BASCOULE COMPLÈTE

Immatriculations, couvertures et garanties

HABILITATION	ORGANISME ÉMETTEUR	RÉFÉRENCE	PÉRIMÈTRE	STATUT
Entité enregistrée	Registre des sociétés, États-Unis	Elevate IT Solutions LLC	Nom commercial et identité juridique	Actif
Immatriculation fiscale	Administration fiscale, États-Unis	EIN 75-3948210	Toutes les prestations facturées	Actif
Assurance responsabilité civile professionnelle	Assureur commercial	Disponible sur demande	Infrastructure et services informatiques gérés	Renouvelé chaque année
Assurance responsabilité civile générale	Assureur commercial	Disponible sur demande	Travaux sur site et dans les locaux du client	Renouvelé chaque année

Adhésion à un organisme professionnel	Association professionnelle, États-Unis	Disponible sur demande	Code de déontologie et procédure de réclamation	En règle
---------------------------------------	---	------------------------	---	----------

Les certificats et les tableaux de garanties sont fournis sur demande et sont réémis à Bramwell Legal Group sur demande à tout moment pendant la mission.

Elevate a transformé l'IT incohérente de cinq bureaux en un seul système auquel nous faisons enfin confiance pour les dossiers clients, et personne n'a perdu une seule heure facturable à cause d'une panne.

Marcus Whitfield

02

Périmètre de la mission

Une mission de services gérés et d'infrastructure standardisant la sécurité réseau, l'infrastructure serveur et le support d'assistance dans les cinq bureaux de Bramwell Legal Group.

01

Évaluation réseau et sécurité

Audit du matériel, de la configuration des pare-feux et de la couverture de sauvegarde dans les cinq bureaux.

02

Standardisation des pare-feux et postes

Appareils de pare-feu uniformes et sécurité des postes gérée déployés dans toute l'entreprise.

03

Migration du stockage de fichiers

Migration vers une infrastructure de stockage de fichiers centralisée, chiffrée et surveillée.

04

Automatisation et vérification des sauvegardes

Sauvegardes nocturnes automatisées avec tests de restauration hebdomadaires dans tous les bureaux.

05

Déploiement VoIP

Lignes téléphoniques héritées remplacées par un système VoIP unifié dans tous les sites.

06

Transition et formation de l'assistance

Assistance continue 24 h/24, 7 j/7 mise en place, accompagnée d'une formation du personnel à la sensibilisation à la sécurité.

Livrables

01

ÉVALUATION

Évaluation réseau des cinq bureaux

Audit complet du matériel, de la posture de sécurité et de la couverture de sauvegarde dans les cinq bureaux.

02

SÉCURITÉ

Pare-feu et protection des terminaux standardisés

Appareils pare-feu et sécurité des terminaux uniformes déployés dans les cinq bureaux.

03

INFRASTRUCTURE

Stockage de fichiers chiffré et surveillé

Migration du stockage de fichiers du cabinet vers une infrastructure centralisée, chiffrée et surveillée.

04

SAUVEGARDE

Sauvegardes automatisées et vérifiées

Sauvegardes automatisées quotidiennes avec vérification hebdomadaire de restauration dans tous les bureaux.

05


COMMUNICATIONS

Déploiement d'un système téléphonique VoIP

Système téléphonique VoIP unifié remplaçant les lignes téléphoniques existantes dans les cinq bureaux.

● HORS PÉRIMÈTRE

- Licences de logiciels de gestion de dossiers et de cabinet juridique
- Nouveaux aménagements de bureaux, câblage ou construction physique
- Achats de matériel au-delà des pare-feu, commutateurs et postes de travail spécifiés
- Souscription de la police de cyberassurance (responsabilité du client)

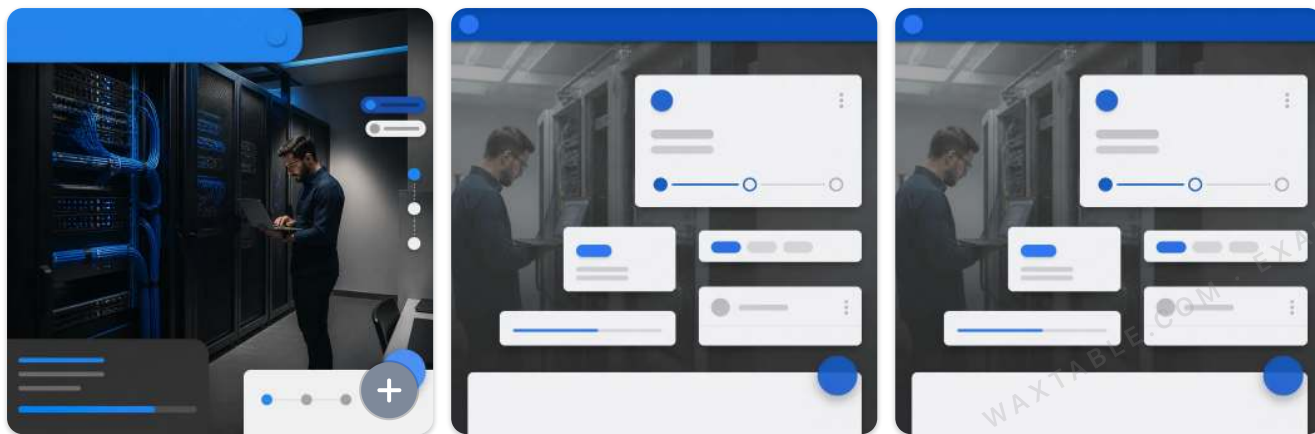

01

SEMAINES 1–2 · ÉVALUATION DU RÉSEAU

Audit complet du matériel, de la posture de sécurité et de la couverture des sauvegardes dans les cinq bureaux.

02

SEMAINES 3–6 · DÉPLOIEMENT PARE-FEU ET SÉCURITÉ DES TERMINAUX

Pare-feu standardisé et protection des terminaux déployés bureau par bureau.

03

SEMAINES 7–10 · MIGRATION DU STOCKAGE DE FICHIERS ET DES SAUVEGARDES

Stockage de fichiers migré vers une infrastructure chiffrée avec sauvegardes automatisées et vérifiées.

04

SEMAINES 11–12 · DÉPLOIEMENT VOIP

Système téléphonique VoIP unifié installé et basculé dans les cinq bureaux.

03

Investissement et conditions

Bramwell fournit un accès administratif aux serveurs et au matériel réseau existants dans chaque bureau, et un représentant du cabinet est autorisé à approuver les fenêtres de migration. Cette proposition est valable pour les engagements débutant au plus tard le 21 août 2026.

FLUX DE TRAVAIL	SEMAINES	TAUX	MONTANT
Évaluation réseau et sécurité des cinq bureaux Audit du matériel, du pare-feu et des sauvegardes sur tous les sites	1	\$18,000	\$18,000
Déploiement de la sécurité pare-feu et des terminaux Appareils pare-feu standardisés et protection des terminaux, 5 bureaux	5	\$6,400 / office	\$32,000
Migration du stockage de fichiers chiffré Infrastructure de stockage centralisée, chiffrée et surveillée	1	\$36,000	\$36,000
Déploiement de sauvegardes automatisées Sauvegardes automatisées nocturnes avec vérification hebdomadaire de restauration	5	\$2,800 / office	\$14,000
Déploiement du système VoIP Système téléphonique VoIP unifié, installation et portabilité des numéros	5	\$4,200 / office	\$21,000
Formation du personnel à la sensibilisation à la sécurité Sessions de formation sur le hameçonnage et l'hygiène de sécurité, tous bureaux	5	\$1,400 / office	\$7,000

Total de la mission

\$148,600

Honoraires de mission

\$148,600

Taxe de vente et d'usage du

Texas – 8,25 %

\$12,260

Total

\$160,860

TOTAL DÛ

\$160,860

Tous les montants sont en USD. Facturation en trois étapes : 40 % à la signature, 30 % au début de la réalisation, 30 % à la livraison. Ce tarif est garanti pour tout engagement débutant au plus tard le 21 août 2026.

ÉVALUATION ET
STANDARDISATION

\$42,000

- Évaluation réseau et sécurité des cinq bureaux
- Pare-feu et protection des terminaux standardisés
- Plan de migration et documentation de retour arrière
- 30 jours de support post-déploiement

MISE À NIVEAU
COMPLÈTE DE
L'INFRASTRUCTURE

\$148,600

- Tout ce qui est inclus dans Évaluation et standardisation
- Migration de stockage de fichiers chiffré et surveillé
- Sauvegardes quotidiennes automatisées et vérifiées
- Déploiement VoIP dans les cinq bureaux

PARTENARIAT
GÉRÉ

\$6,800/mo

- Tout ce qui est inclus dans Mise à niveau complète de l'infrastructure
- Assistance gérée 24 h/24, 7 j/7 avec temps de réponse garantis
- Formation trimestrielle à la sensibilisation à la sécurité
- Gestion et surveillance continues des correctifs

	ÉVALUATION ET STANDARDISATION	MISE À NIVEAU COMPLÈTE DE L'INFRASTRUCTURE	PARTENARIAT GÉRÉ
Prix	\$42,000	\$148,600	\$6,800/mo
Périmètre principal	Évaluation réseau et sécurité des cinq bureaux	Tout ce qui est inclus dans Évaluation et standardisation	Tout ce qui est inclus dans Mise à niveau complète de l'infrastructure
Ce qui est inclus	Pare-feu et protection des terminaux standardisés	Migration de stockage de fichiers chiffré et surveillé	Assistance gérée 24 h/24, 7 j/7 avec temps de réponse garantis
Livraison	Plan de migration et documentation de retour arrière	Sauvegardes quotidiennes automatisées et vérifiées	Formation trimestrielle à la sensibilisation à la sécurité
Suivi après livraison	30 jours de support post-déploiement	Déploiement VoIP dans les cinq bureaux	Gestion et surveillance continues des correctifs

Les prix sont indiqués en USD et n'incluent pas la taxe de vente et d'usage du Texas – 8.25%. Les options peuvent être combinées ou échelonnées ; la recommandation pour Bramwell Legal Group est mise en avant dans la section tarifaire.

Échéance de chaque versement

N°	JALON	DÉCLENCEUR	PART	MONTANT
01	Semaines 1–2 · Évaluation du réseau	24 août 2026	40%	\$59,440

02	Semaines 3–6 · Déploiement pare-feu et sécurité des terminaux	Au démarrage de la livraison	30%	\$44,580
03	Semaines 7–10 · Migration du stockage de fichiers et des sauvegardes	À l'acceptation du jalon	30%	\$44,580
Total (HT)			100%	\$148,600

Les échéances sont facturées sur la base des jalons ci-dessus et sont payables dans un délai de 30 jours à compter de chaque facture. Tous les montants sont en USD et excluent taxe de vente et d'utilisation du texas — 8.25%.

+ Hypothèses sur lesquelles repose cette estimation

Bramwell fournit un accès administrateur aux serveurs et au matériel réseau existants de chaque bureau, et un représentant du cabinet est autorisé à approuver les fenêtres de migration. Cette proposition est valable pour tout engagement débutant au plus tard le 21 août 2026.

La contresignature ci-dessous vaut acceptation du périmètre, du calendrier et de l'investissement définis dans cette proposition et autorise le démarrage des travaux.

01 POUR BRAMWELL LEGAL GROUP

Marcus Whitfield

Directrice des opérations

Date

02 POUR ELEVATE IT SOLUTIONS

Elevate IT Solutions

Signataire autorisé

Date



PROCHAINES ÉTAPES

Prêts quand vous le serez

L'acceptation de cette proposition déclenche le début des travaux le 24 août 2026. Le tarif reste valable pour les missions confirmées avant le 21 août 2026.

Approuvez cette proposition et nous planifions l'évaluation réseau pour la semaine du 24 août. Répondez à ce document ou écrivez à support@elevateitsolutions.com.

Elevate IT Solutions
