

PROPOSTA PARA RIPPLE RIDE CARPOOLING

Proposta de Desenvolvimento do Ripple Ride

Um aplicativo nativo de caronas compartilhadas para iOS e Android, construído e lançado antes da janela de lançamento do Ripple Ride em Austin.



Sumário

01	Resumo geral	2
02	O projeto em números	3
03	A oportunidade	4
04	Resumo executivo	4
05	A experiência atual	4
06	Desafio e abordagem	5
07	Pontos de prova	6
08	Situação e coberturas	6
09	Em suas palavras	7
10	Escopo do trabalho	8
11	O que está incluído	8
12	Entregas	8
13	Trabalhos selecionados	9
14	Cronograma	10
15	Investimento e condições	11
16	Detalhamento de honorários	11
17	Resumo de custos	12
18	Opções de contratação	12
19	Comparativo de opções	12
20	Cronograma de pagamento	13
21	Premissas das quais esta estimativa depende	15
22	Aceite	15

RESUMO GERAL

PROPOSTA

PRO-2026-0611

PARA APROVAÇÃO

PREPARADO PARA

**Ripple Ride
Carpooling —
Priya Nair,
Chefe de
Operações**

PREPARADO POR

**Tilebright
Apps, Austin**

EMITIDO

**16 de março
de 2026**

VÁLIDO ATÉ

**30 de abril
de 2026**

CONTRATAÇÃO

**Desenvolvimento
de Aplicativo
Móvel**

RESUMO GERAL

▲ O projeto em cinco números

CONTRATAÇÃO

Desenvolvimento de Aplicativo Móvel

Um aplicativo nativo de caronas compartilhadas para iOS e Android, construído e lançado antes da janela de lançamento do Ripple Ride em Austin.

INVESTIMENTO

\$255,470

\$236,000, mais imposto sobre vendas de Travis County (8,25%)

INÍCIO

13 de abril de 2026

Sujeito a aceitação até 30 de abril de 2026

DURAÇÃO

12 meses

Do início à entrega final

PREPARADO PARA

**Ripple Ride
Carpooling**

Priya Nair, Responsável
por operações

01

A oportunidade

A Ripple Ride está abrindo seu mercado em Austin neste outono, sincronizado com o início do semestre, quando a demanda por caronas compartilhadas da UT Austin e da força de trabalho de tecnologia em geral atinge o pico. A equipe já garantiu uma parceria de recrutamento de motoristas e uma data de lançamento que não vai mudar — o que ainda falta é um aplicativo nativo capaz de suportar esse tráfego já no primeiro dia.



■ Resumo executivo

O Ripple Ride construiu sua rede de motoristas e garantiu uma parceria de lançamento programada para o semestre de outono, mas o produto em si ainda é um conjunto de fluxos no Figma e um backend de protótipo. A empresa tem uma única chance de causar uma primeira impressão em um mercado onde os passageiros já recorrem por hábito a aplicativos de caronas, e um app lento, cheio de falhas ou inacabado no dia do lançamento anularia meses de recrutamento de motoristas.

A Tilebright Apps propõe um projeto de dezesseis semanas para projetar e construir aplicativos nativos para iOS e Android em paralelo com um backend de pareamento de caronas, para que o Ripple Ride seja lançado com um app tão rápido e confiável quanto a rede por trás dele. Conduzimos design, os dois desenvolvimentos nativos e o QA como uma única trilha coordenada em vez de um revezamento, para que nada espere mais do que o necessário. As seções a seguir apresentam a abordagem, o escopo, o cronograma e o investimento.



Store seja uma formalidade, e não o primeiro teste real.

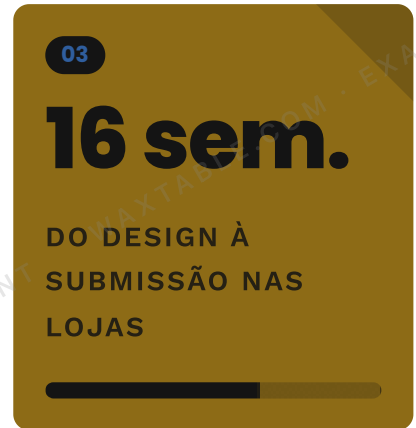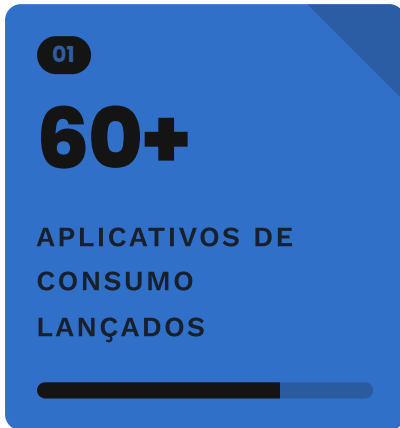

SITUAÇÃO

Registros, coberturas e garantias

CREDENCIAL	ÓRGÃO EMISSOR	REFERÊNCIA	ESCOPO	STATUS
Entidade registrada	Registro de empresas, Estados Unidos	Tilebright Apps LLC	Nome fantasia e identidade jurídica	Ativo
Registro fiscal	Autoridade fiscal, Estados Unidos	EIN 47-2810366	Todos os trabalhos faturados	Ativo
Seguro de responsabilidade civil profissional	Seguradora comercial	Disponível mediante solicitação	Desenvolvimento de Aplicativo Móvel	Renovado anualmente

Filiação a entidade de classe	Associação setorial, Estados Unidos	Disponível mediante solicitação	Código de conduta e canal de reclamações	Em situação regular
-------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------	--	---------------------

Certificados e apólices são fornecidos mediante solicitação e reemitidos para Ripple Ride Carpooling mediante solicitação a qualquer momento durante o contrato.



A Tilebright entregou os dois aplicativos com duas semanas de antecedência e nossa análise na App Store passou de primeira.



DANA OKAFOR



02

Escopo do trabalho

Um projeto de dezesseis semanas para projetar e desenvolver o aplicativo de caronas compartilhadas para deslocamento diário da Ripple Ride para iOS e Android, do fluxo de integração até o lançamento na App Store e na Play Store.

Design de produto e UX

Mapeamento de fluxos, wireframes e o sistema de UI flat, validados com sessões de usabilidade com motoristas e passageiros.

Construção para iOS

Desenvolvimento nativo em Swift/SwiftUI do aplicativo completo, do onboarding até a conclusão da corrida.

Construção para Android

Desenvolvimento nativo em Kotlin do aplicativo completo, construído em paralelo ao iOS a partir de um sistema de design compartilhado.

Backend de correspondência de corridas

Serviço de correspondência baseado em rota e horário, com atualizações de status em tempo real para ambos os aplicativos.

QA e testes em dispositivos

Testes entre dispositivos e em condições de rede degradada antes de qualquer um dos aplicativos chegar à loja.

Lançamento e envio às lojas

Listagens de loja, pacotes de revisão e apoio à submissão tanto para a App Store quanto para o Google Play.

■ Entregas

01

DESIGN DE PRODUTO

Sistema de design de interface plano

Um sistema de design plano completo — estados de status em blocos de cor, iconografia e ambos os fluxos do aplicativo — cobrindo desde a integração até a conclusão da corrida.

02

DESENVOLVIMENTO IOS

Aplicativo nativo para iOS

Uma versão nativa em Swift/SwiftUI de toda a experiência de passageiro e motorista, submetida à App Store.

03

DESENVOLVIMENTO ANDROID

Aplicativo nativo para Android

Uma versão nativa em Kotlin de toda a experiência de passageiro e motorista, submetida ao Google Play.

04

BACKEND

API de correspondência de caronas

Um serviço de backend que conecta passageiros a motoristas por rota e horário, com atualizações de status em tempo real em ambos os aplicativos.

05




QA

Rodada de QA de dispositivos e rede

Testes em uma matriz de dispositivos atuais e de três anos de uso, sob condições de rede degradadas.

FORA DO ESCOPO

- Integração de processador de pagamento além da configuração inicial do Stripe Connect
- Seleção e integração de fornecedor de verificação de antecedentes de motoristas
- Campanhas pagas de aquisição de usuários ou marketing
- Trabalho de funcionalidades além do escopo acordado da v1.0

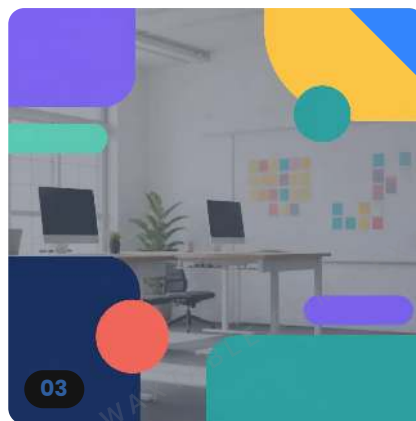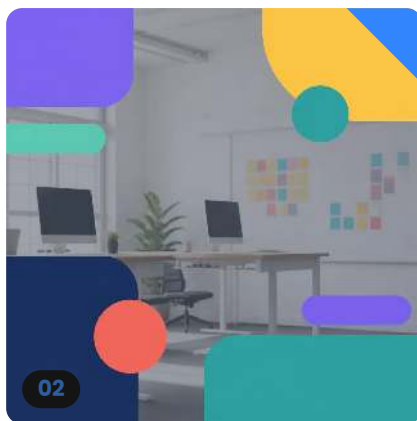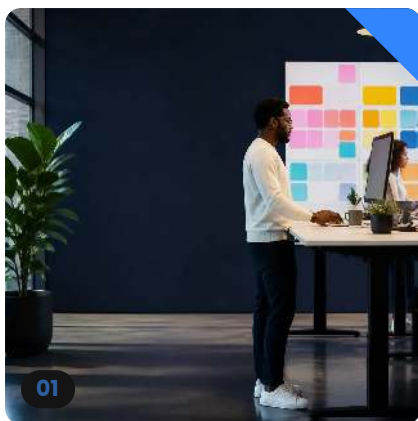

01 SEMANAS 1-3 · DESCOBERTA E DESIGN

Mapeamento de fluxos, wireframes e o sistema de design UI flat, validados em sessões de usabilidade com motoristas e passageiros.

02 SEMANAS 4-9 · CONSTRUÇÃO PRINCIPAL

iOS, Android e o backend de pareamento de caronas desenvolvidos em paralelo a partir de um sistema de design compartilhado.

03 SEMANAS 10-12 · RECURSOS DE CONFIANÇA E SEGURANÇA

Status de verificação, avaliações e mensagens no aplicativo integrados ao fluxo principal de pareamento.

04 SEMANAS 13-14 · QA E TESTES EM DISPOSITIVOS

Testes multi-dispositivo e em rede degradada em uma matriz de celulares atuais e mais antigos.

03

Investimento e condições

A Ripple Ride fornece acesso à API de seu trabalho existente de verificação de motoristas e pagamentos em andamento no kickoff, um responsável de produto tem autoridade para aprovar decisões de design e escopo em cada etapa, e a data de lançamento no outono é mantida conforme planejado. Alterações a esses pontos afetam o cronograma e o custo, o que acordaríamos por escrito antes de prosseguir. O valor é válido para contratações iniciadas até 30 de abril de 2026.

FRENTE DE TRABALHO	SEMANAS	TAXA	VALOR
Design de produto Sistema de design UI flat, mapeamento de fluxos e validação de usabilidade	3	\$7,000 / wk	\$21,000
Desenvolvimento iOS Build nativo em Swift/SwiftUI da experiência completa de passageiro e motorista	8	\$9,000 / wk	\$72,000
Desenvolvimento Android Build nativo em Kotlin da experiência completa de passageiro e motorista	8	\$9,000 / wk	\$72,000
Backend e API de pareamento de caronas Serviço de pareamento baseado em rota e horário, com atualizações de status em tempo real	6	\$8,500 / wk	\$51,000
QA e testes em dispositivos Etapa de QA multi-dispositivo e em rede degradada antes do envio	2	\$6,000 / wk	\$12,000

Total da contratação**\$236,000**

Taxa do projeto

\$236,000

Imposto sobre vendas do

Condado de Travis (8,25%)

\$19,470

Total

\$255,470**TOTAL
DEVIDO****\$255,470**

Todos os valores estão em USD. Faturamento em três marcos: 40% na assinatura, 30% no início da construção, 30% na entrega. O valor é válido para contratações iniciadas até 30 de abril de 2026.

LANÇAMENTO**\$236,000**

- Desenvolvimento completo de dezesseis semanas
- Aplicativos nativos iOS + Android
- Backend e API de correspondência de corridas
- Envio à App Store e à Play Store

01**RECOMMENDED****LANÇAMENTO
+ CUIDADO
CONTÍNUO****\$4,800/mo**

- Tudo do plano Lançamento
- Lançamentos mensais de correção de bugs e atualização de SO
- Monitoramento e triagem de falhas
- SLA de resposta prioritária

02**PARCEIRO
DE PRODUTO****\$9,500/mo**

- Tudo dos Cuidados
- Lançamentos trimestrais de funcionalidades
- Análises e relatórios de funil
- Tempo de design de produto dedicado

03**OPÇÕES**

Qual modelo combina com você

	LANÇAMENTO	LANÇAMENTO + CUIDADO CONTÍNUO	PARCEIRO DE PRODUTO
Preço	\$236,000	\$4,800/mo	\$9,500/mo
Escopo principal	Desenvolvimento completo de dezesseis semanas	Tudo do plano Lançamento	Tudo dos Cuidados
O que está incluído	Aplicativos nativos iOS + Android	Lançamentos mensais de correção de bugs e atualização de SO	Lançamentos trimestrais de funcionalidades
Entrega	Backend e API de correspondência de corridas	Monitoramento e triagem de falhas	Análises e relatórios de funil
Suporte pós-entrega	Envio à App Store e à Play Store	SLA de resposta prioritária	Tempo de design de produto dedicado

Os preços estão em USD e não incluem o imposto sobre vendas (travis county, 8.25%). As opções podem ser combinadas ou escalonadas; a recomendação para Ripple Ride Carpooling está destacada na seção de preços.

CRONOGRAMA DE PAGAMENTO

Quando cada parcela vence

N.º	MARCO	GATILHO	PARCELA	VALOR
-----	-------	---------	---------	-------

01	Semanas 1–3 · Descoberta e design	13 de abril de 2026	40%	\$94,400
02	Semanas 4–9 · Construção principal	No início da entrega	30%	\$70,800
03	Semanas 10– 12 · Recursos de confiança e segurança	Na aceitação do marco	30%	\$70,800
Total (sem impostos)			100%	\$236,000

As parcelas são faturadas conforme os marcos acima e são pagáveis em até 30 dias após cada fatura. Todos os valores estão em USD e não incluem imposto sobre vendas de Travis County (8,25%).

● Premissas das quais esta estimativa depende

A Ripple Ride fornece acesso via API ao seu trabalho em andamento de verificação de motoristas e pagamentos logo no início do projeto, um responsável de produto tem autonomia para aprovar decisões de design e escopo em cada etapa, e a data de lançamento no outono se mantém conforme planejado. Alterações a esses pontos afetam prazo e custo, o que acordaríamos por escrito antes de prosseguir. O valor é válido para contratações iniciadas até 30 de abril de 2026.

A contra-assinatura abaixo aceita o escopo, o cronograma e o investimento definidos nesta proposta e autoriza o início do trabalho.



PELA RIPPLE RIDE CARPOOLING

Priya Nair

Chefe de Operações

Data

01



PELA TILEBRIGHT APPS

Tilebright Apps

Signatário autorizado

Data

02

PRÓXIMOS PASSOS

Prontos quando você estiver

A aceitação desta proposta dá início ao trabalho em 13 de abril de 2026. O valor permanece válido para contratações confirmadas até 30 de abril de 2026.

Aprove esta proposta e poderemos realizar o kickoff de design na semana de 13 de abril. Responda a este documento ou envie um e-mail para build@tilebrightapps.com.

Tilebright Apps

build@tilebrightapps.com · +1 512 555 0164 · tilebrightapps.com · Austin, TX 78701
