

PROPOSTA PARA BLUE MOON DINER

Proposta Blue Moon Neon

Vidro curvado à mão para uma noite de reabertura inesquecível.

Sumário

01	Resumo geral	2
02	O projeto em números	3
03	A oportunidade	4
04	Resumo executivo	4
05	A experiência atual	4
06	Desafio e abordagem	5
07	Pontos de prova	5
08	Situação e coberturas	5
09	Em suas palavras	7
10	Escopo do trabalho	8
11	O que está incluído	8
12	Entregas	9
13	Trabalhos selecionados	9
14	Cronograma	10
15	Investimento e condições	11
16	Detalhamento de honorários	11
17	Resumo de custos	11
18	Opções de contratação	12
19	Comparativo de opções	12
20	Cronograma de pagamento	13
21	Premissas das quais esta estimativa depende	14
22	Aceite	14

RESUMO GERAL

PROPOSTA

PRO-2026-0058

PARA APROVAÇÃO

PREPARADO PARA

Blue Moon
Diner — Nadine
Ochoa,
Proprietária

PREPARADO POR

Afterglow Neon
Works, Las
Vegas

EMITIDO

2 de fevereiro
de 2026

VÁLIDO ATÉ

4 de março
de 2026

CONTRATAÇÃO

Letreiros de
Neon
Personalizados

RESUMO GERAL

O projeto em cinco números

CONTRATAÇÃO

Letreiros de Neon
Personalizados

Vidro curvado à mão
para uma noite de
reabertura
inesquecível.

DURAÇÃO

Até março de 2026
(projeto de
instalação único)

Do início à
entrega final

INVESTIMENTO

\$18,207.00

\$16,800.00 mais
imposto sobre vendas
do condado de clark
(8.375%)

PREPARADO PARA

Blue Moon Diner
Nadine Ochoa,
Proprietário

INÍCIO

9 de fevereiro
de 2026

Sujeito a aceitação até
4 de março de 2026

01

A oportunidade

O Blue Moon Diner está reabrindo após uma reforma da cozinha e do salão, mas o letreiro luminoso que marca a esquina desde os anos 1960 está estruturalmente comprometido e além de qualquer reparo de iluminação. Uma reabertura na Fremont Street depende do que brilha vindo da rua, e a lanchonete quer sua identidade retrô restaurada — mais brilhante, mais segura e construída para durar mais algumas décadas — a tempo da noite de reabertura.

Resumo executivo

A Afterglow Neon Works propõe um pacote completo de sinalização que abrange a reconstrução da marquise do telhado, a sinalização das vitrines e a tubulação de acabamento interna das mesas, tudo curvado à mão em nossa oficina da Main Street. Cada elemento é projetado, licenciado e instalado dentro de um cronograma de três semanas, concluído antes da data anunciada de reabertura.

O resultado é uma lanchonete inconfundível a duas quadras de distância, com fiação e fixação construídas conforme as normas vigentes, em vez de remendadas sobre a estrutura original.



A estrutura de aço da marquise atual corroeu além do ponto seguro para nova fixação, a lanchonete tem um prazo fixo de três semanas até a reabertura, e qualquer trabalho de sinalização externa nesse distrito exige licença municipal antes do início da fabricação. Perder tempo com atrasos na licença empurraria a instalação para depois da noite de reabertura anunciada.

A Afterglow protocola o pedido de licença de sinalização na mesma semana em que o projeto é aprovado, de modo que a análise municipal ocorra em paralelo à curvatura do vidro, e não depois dela. A fabricação, a fiação e a tubulação interna avançam em trilhas separadas que convergem para uma única equipe de instalação de dois dias, mantendo todo o projeto dentro da janela de três semanas.

7

LETREIROS DE NEON
PERSONALIZADOS

210

PÉS LINEARES DE
TUBO DE VIDRO

3

SEMANAS ATÉ A
REABERTURA

SITUAÇÃO

Registros, coberturas e garantias

CREDENCIAL	ÓRGÃO EMISSOR	REFERÊNCIA	ESCOPO	STATUS
Entidade registrada	Registro de empresas, USA	Afterglow Neon Works LLC	Nome fantasia e identidade jurídica	Ativo
Registro fiscal	Autoridade fiscal, USA	88-1734920	Todos os trabalhos faturados	Ativo
Seguro de responsabilidade civil profissional	Seguradora comercial	Disponível mediante solicitação	Letreiros de Neon Personalizados	Renovado anualmente
Seguro de responsabilidade civil geral	Seguradora comercial	Disponível mediante solicitação	Trabalhos no local e nas instalações do cliente	Renovado anualmente
Filiação a entidade de classe	Associação setorial, USA	Disponível mediante solicitação	Código de conduta e canal de reclamações	Em situação regular

Certificados e apólices são fornecidos mediante solicitação e reemitidos para Blue Moon Diner mediante solicitação a qualquer momento durante o contrato.



**O letreiro luminoso parece
exatamente como quando meu
avô abriu este lugar, só que agora
não vai cair numa tempestade de
vento. A Afterglow conseguiu
acendê-lo duas noites antes da
reabertura.**



NADINE OCHOA

02

Escopo do trabalho

A Afterglow Neon Works projetará, dobrará à mão e instalará um pacote completo de letreiros de neon para a fachada e o interior da reabertura do Blue Moon Diner, do letreiro do telhado aos tubos de acento ao lado das cabines.

01

Design conceitual e renderização

Renderizações de conceito iluminado desenvolvidas para aprovação do proprietário.

02

Curvatura de vidro e fabricação de tubos

Curvatura manual realizada na oficina da Main Street.

03

Montagem de transformador e fiação

Transformadores de baixa voltagem montados e testados para cada letreiro.

04

Solicitação de licença e revisão de código

Licença municipal de letreiro solicitada e acompanhada durante a revisão.

05

Fixação estrutural

Estrutura do telhado reconstruída conforme o código estrutural atual.

06

Instalação e conexão elétrica

Instalação no local e conexão elétrica por equipe licenciada.

Entregas



01

DESIGN

Design e renderização do letreiro do telhado

Três renderizações de conceito iluminado para o letreiro do telhado antes da fabricação.

02

FABRICAÇÃO

Tubulação de vidro dobrada à mão (letreiro do telhado)

Um letreiro de nove pés dobrado à mão em duas cores de tubo de neon.

03

FABRICAÇÃO

Sinalização das vitrines

Letreiro em script 'Blue Moon Diner' e um letreiro de janela 'OPEN', dobrados à mão para combinar com o letreiro principal.

04

FABRICAÇÃO

Tubulação de acabamento interna das mesas

Tubulação de acento em ciano instalada ao longo de doze encostos de cabine.

05


INSTALAÇÃO

Montagem estrutural e ligação elétrica

Montagem estrutural reconstruída e ligação elétrica em conformidade com o código para todos os letreiros externos.

FORA DO ESCOPO

- Repintura ou reparo de fachada do prédio
- Reforma de estofados de móveis internos ou cabines
- Design de cardápio ou letreiros impressos
- Custos contínuos de eletricidade para operação da sinalização

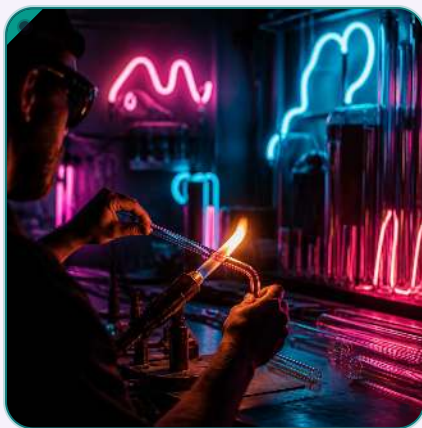

01

APROVAÇÃO DO PROJETO

Conceitos da marquise e da sinalização das vitrines aprovados pela proprietária.

02

CURVATURA DOS TUBOS DE VIDRO

Curvatura à mão da marquise, das vitrines e da tubulação das mesas.

03

SOLICITAÇÃO DE LICENÇA E VISTORIA MUNICIPAL

Licença de sinalização protocolada e liberada para instalação.

04

MONTAGEM E FIAÇÃO DA SINALIZAÇÃO

Transformadores conectados e testados antes do dia da instalação.

03

Investimento e condições

Esta proposta pressupõe que o proprietário do imóvel aprove os pontos de fixação na fachada antes do início da fabricação, que haja acesso ao telhado para avaliação estrutural, e que a seleção final de cor do vidro seja aprovada a partir de amostras acesas durante a fase de design. Os preços são válidos por trinta dias a partir da data de emissão acima.

FRENTE DE TRABALHO	SEMANAS	TAXA	VALOR
Design conceitual e renderização 3 conceitos de marquise para o telhado	1	\$950.00	\$950.00
Marquise para o telhado (vidro curvado à mão) Marquise de 9 pés, tubulação em 2 cores	1	\$6,400.00	\$6,400.00
Sinalização das vitrines Letreiro em script 'Blue Moon Diner' + 'OPEN'	2	\$1,150.00	\$2,300.00
Tubulação de acabamento interna das mesas 12 mesas, acabamento em ciano	12	\$180.00	\$2,160.00
Transformadores e fiação Conjuntos de transformadores de baixa voltagem	9	\$210.00	\$1,890.00
Solicitação de licença e inspeção Licença municipal de letreiro, análise de conformidade	1	\$620.00	\$620.00

Total da contratação**\$16,800.00**

Taxa do projeto

\$16,800.00

Imposto sobre vendas do
Condado de Clark (8,375%) \$1,407.00

Total \$18,207.00

TOTAL \$18,207.00
DEVIDO

Todos os valores estão em USD. Cobrado em três marcos: 40% na assinatura, 30% no início da produção, 30% na entrega. O valor é válido para contratações iniciadas até 4 de março de 2026.

01

SOMENTE SINALIZAÇÃO DE VITRINE

\$3,250

- Sinalização de vitrine 'ABERTO' e do nome
- Transformador e fiação padrão
- Solicitação de licença incluída
- Garantia de 6 meses

02

PACOTE DE FACHADA

\$13,650

- Letreiro do telhado + sinalização de vitrine
- Renderizações de design incluídas
- Licença municipal e inspeção
- Garantia de transformador de 1 ano

03

PACOTE COMPLETO DO DINER

\$18,207

- Letreiro luminoso, vitrine e tubulação interna
- 12 boxes de iluminação de destaque
- Licenciamento e instalação completos
- Garantia e serviço de 1 ano

OPÇÕES

Qual modelo combina com você

SOMENTE
SINALIZAÇÃO
DE VITRINE

PACOTE DE
FACHADA

PACOTE
COMPLETO DO
DINER

Preço	\$3,250	\$13,650	\$18,207
Escopo principal	Sinalização de vitrine 'ABERTO' e do nome	Letreiro do telhado + sinalização de vitrine	Letreiro luminoso, vitrine e tubulação interna
O que está incluído	Transformador e fiação padrão	Renderizações de design incluídas	12 boxes de iluminação de destaque
Entrega	Solicitação de licença incluída	Licença municipal e inspeção	Licenciamento e instalação completos
Suporte pós-entrega	Garantia de 6 meses	Garantia de transformador de 1 ano	Garantia e serviço de 1 ano

Os preços estão em USD e não incluem o imposto sobre vendas do condado de Clark (8.375%). As opções podem ser combinadas ou escalonadas; a recomendação para Blue Moon Diner está destacada na seção de preços.

CRONOGRAMA DE PAGAMENTO

Quando cada parcela vence

N.º	MARCO	GATILHO	PARCELA	VALOR
01	Aprovação do projeto	9 de fevereiro de 2026	40%	\$6,720.00
02	Curvatura dos tubos de vidro	No início da entrega	30%	\$5,040.00
03	Solicitação de licença e vistoria municipal	Na aceitação do marco	30%	\$5,040.00
Total (sem impostos)			100%	\$16,800.00

As parcelas são faturadas com base nos marcos acima e devem ser pagas em até 30 dias após cada fatura. Todos os valores estão em USD e excluem imposto sobre vendas do condado de clark (8.375%).

● Premissas das quais esta estimativa depende

Esta proposta pressupõe que o proprietário do imóvel aprove os pontos de fixação na fachada antes do início da fabricação, que haja acesso ao telhado para a avaliação estrutural e que a seleção final da cor do vidro seja aprovada a partir de amostras acesas durante a fase de projeto. Os preços são válidos por trinta dias a partir da data de emissão acima.

A contra-assinatura abaixo aceita o escopo, o cronograma e o investimento definidos nesta proposta e autoriza o início do trabalho.

PARA BLUE
MOON DINER

Nadine Ochoa

PROPRIETÁRIA

Data

PARA AFTERGLOW
NEON WORKS

Afterglow Neon Works

SIGNATÁRIO AUTORIZADO

Data

PRÓXIMOS PASSOS

Prontos quando você estiver

A aceitação desta proposta dá início ao trabalho em 9 de fevereiro de 2026. O valor permanece válido para contratações confirmadas até 4 de março de 2026.

Assine abaixo para reservar o pedido de venda e a solicitação de instalação. A curvatura dos tubos leva duas semanas por si só, e o tubo luminoso pronto antes da data de entrega para ser colocado.

Afterglow Neon Works
